

학교 석면해체 작업 모니터 결과 보고

번암중학교

□ 공사일정

1. 총공사기간 : 2020. 4. 28. ~ 2020. 5. 15.
2. 장소 : 후관 1층 일부, 후관 2층, 강당 입구, 본관 당직실

일정	작업내용	비고
2020.4.28	학교모니터단 사전회의	
2020.4.28	집기류 이사 및 청소	
2020.5.01	비닐 보양작업	
2020.5.02	모니터단 점검 1차 활동	
2020.5.04.~5.07	석면텍스 해체작업	학생 및 외부인 전면 통제
2020.5.08	모니터단 잔류검사 2차 활동	
2020.5.11.~5.14	무석면 텍스 시공	
2020.5.15	집기류 이사 및 청소	

□ 모니터단 구성 : 단장 교장

내부 구성원	단장	교장
	교직원	부장, 행정실장
	학부모	학교운영위원
	감독관	장수지원청시설팀
외부 구성원	전문가	감리원, 외부전문가
	민간단체	시민단체 소속

□ 모니터단 세부 일정 및 활동

1. 2020.4.28.(화) 모니터단 사전회의



2. 석면해체 제거 안전표지판 설치 등



3. 2020.4.29. 사전청소 점검(집기류 이전)





4. 2020.5.2. 모니터단 2차 활동 비닐보양점검





- 틈새여부, 음압기 설치 여부, 근로자 위생설비시설 여부, 비닐두께 및 2중보양 여부 확인
- 미흡부분 보완 확인

5. 2020.5.8. 모니터단 3차활동 석면해체 잔재물 점검

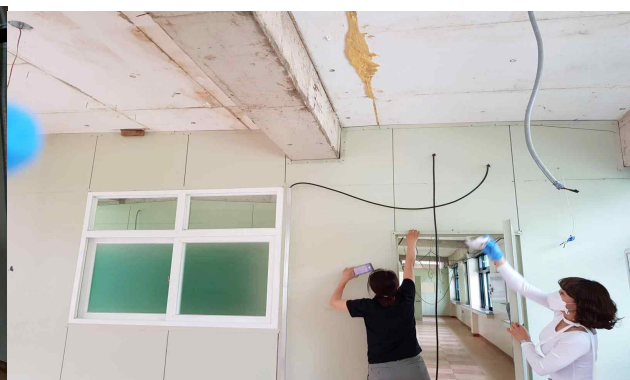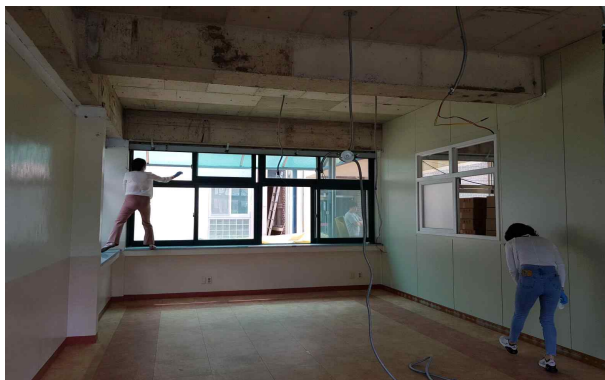

- 석면 잔재물 청소 유무 확인
- 전기배전함 등 함 속 잔재물 다시 한번 청소 보완
- 창문틀, 출입문 틀 청소 보완
- 공기질검사 의뢰

6. 텍스 시공 후



- 정밀 청소 실시
- 반출 집기류 정리정돈 실시

붙임 공기질측정 1부. (별도 서류 보관)
