

## 석면농도측정 결과보고서

석면해체·제거작업 신고번호		익산-20210166
신고현장	현장명(공사명·작업명) 이리신흥초 교사동 석면해체제거공사	전화번호 010-3765-4218
	소재지 전라북도 익산시 하나로3길 10 (금강동, 신흥초등학교) (금강동 349-1)	
신고인	석면해체·제거업자명(상호) 주식회사위너건설	고용노동부 등록번호 5476

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

2021 년 월 일

신고인(석면해체·제거업자)

주식회사위너건설 대표자 김장희 (서명 또는 인)

광주지방고용노동청익산지청장 귀하

첨부서류	별지 제17호의10서식의 석면농도측정 결과표
------	--------------------------

## 석면농도측정 결과표

### 1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명)	
	이리신흥초 교사동 석면해체제거공사	
	현장 소재지	
	전라북도 익산시 하나로3길 10 (금강동, 신흥초등학교) (금강동 349-1)	
	석면해체·제거작업 신고번호	업자명(상호)
	익산-20210166	주식회사위너건설
전화번호		대표자
063-543-6113		김장희

### 2. 측정기간 - 2021 년 07 월 28 일( 1일간 )

### 3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
윤 광 자	대기환경기사	00204140549Z	(주)아쌤환경연구원
고 강 영	-	-	

### 4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량( $l/min$ )	측정농도(개/ $cm^3$ )	초과여부
뒷면 별첨				

### 5. 측정 위치도(측정 장소)

뒷면 별첨

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2021 년      월      일

 아쌤환경연구원

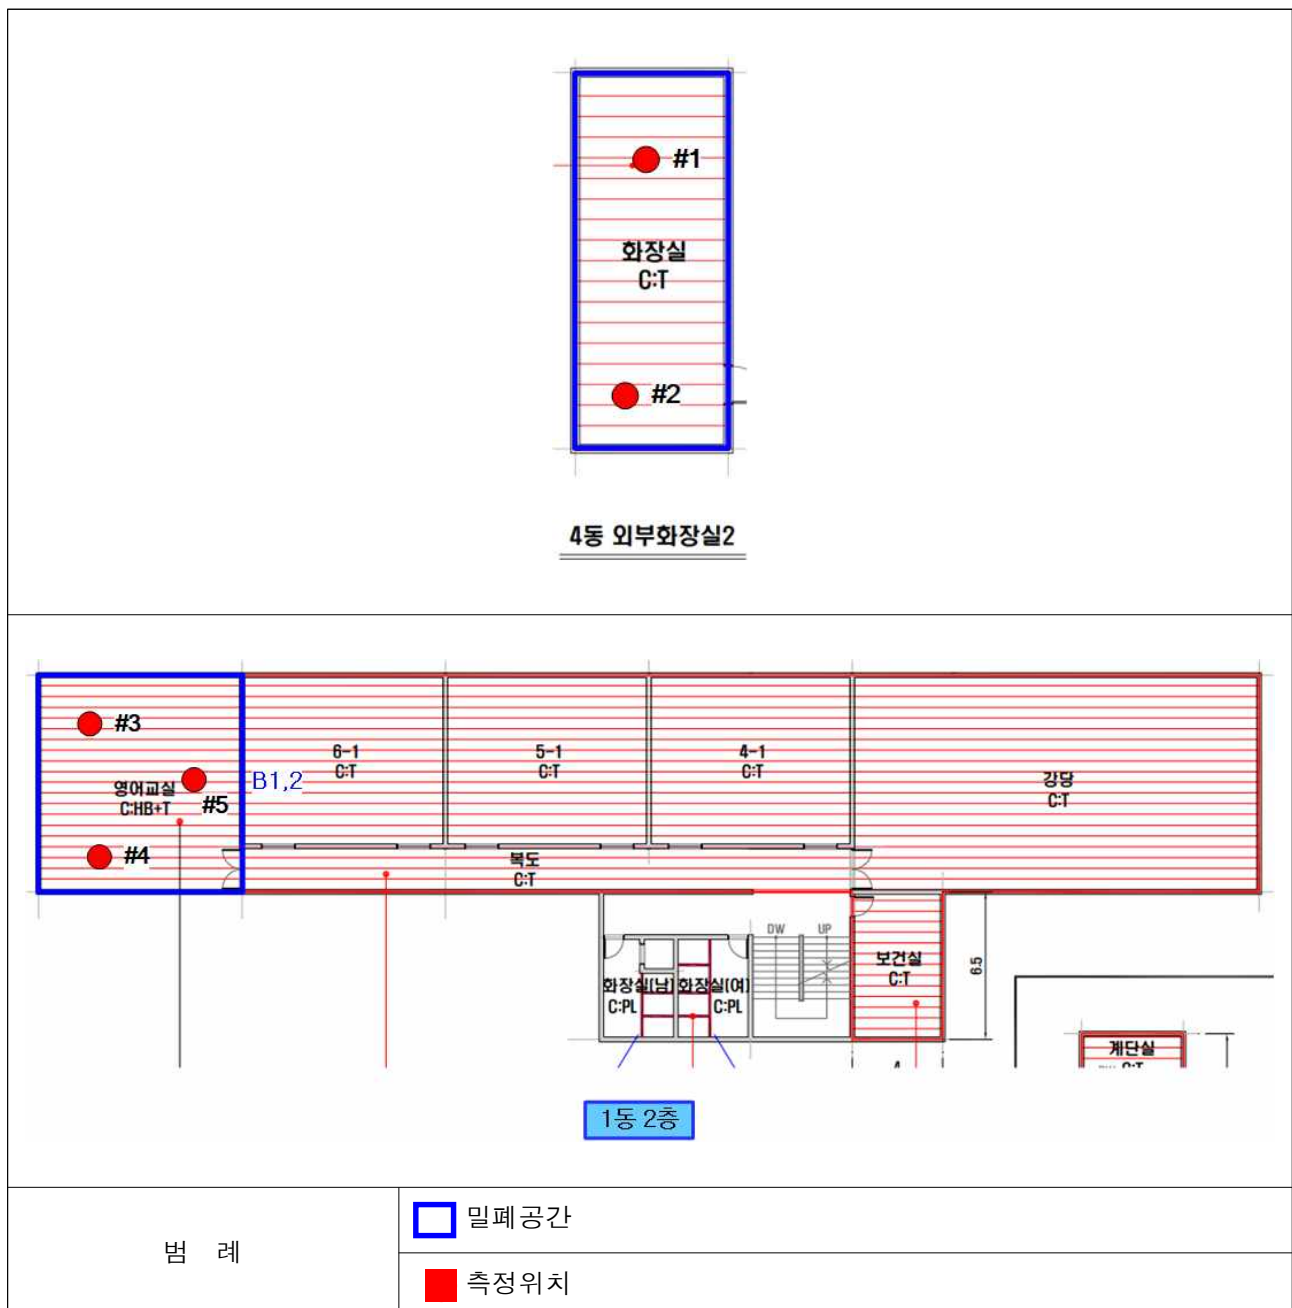


석면해체·제거업자 주식회사위너건설 대표자 김장희 귀하

## 1) 측정결과

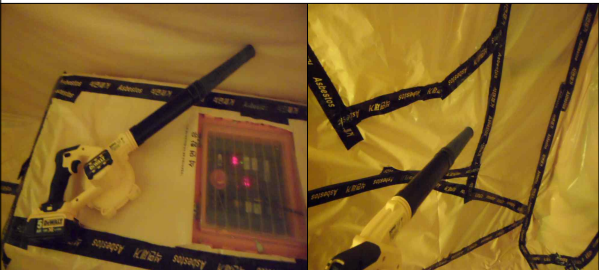


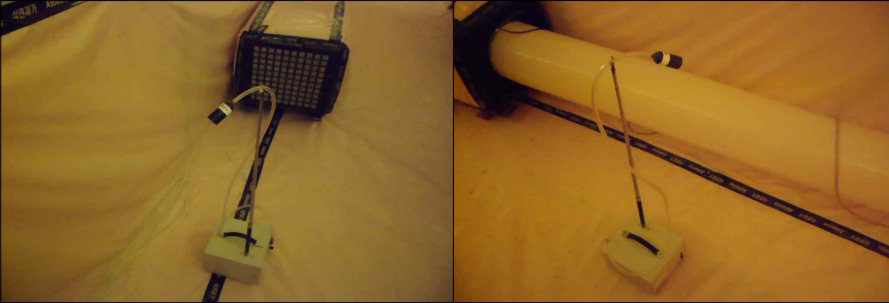

시료번호	측정위치	측정시간(분)	Flow ( $\ell/\text{min}$ )	Volume ( $\ell$ )	측정농도 ( $\text{개}/\text{cm}^3$ )	초과여부
1	4동 외부화장실2 화장실	100	10.05	1,005	0.0054	기준치미만
2	4동 외부화장실2 화장실	100	10.06	1,006	0.0058	기준치미만
3	1동 2층 영어교실	100	10.07	1,007	0.0049	기준치미만
4	1동 2층 영어교실	100	10.08	1,008	0.0058	기준치미만
5	1동 2층 영어교실	100	10.05	1,005	0.0054	기준치미만


## 2) 측정 위치도



### 3) 측정 사진

항목	(실내) 석면해체·제거작업 완료 후 석면농도 측정		공간명 : 이리신흥초
측정시간	시작 10:14	종료 13:01	
투입장비	종류 LX40A	수량 5EA	

구분	사진		사진설명
송풍기			-
			작업일 (2021.07.28)
음압기			-
	 위치 : 4동 외부화장실2, 2동 2층      수량 : 2대		작업일 (2021.07.28)
구분	사진		사진설명
	4동 외부화장실2 화장실	4동 외부화장실2 화장실	
에어샘플러 설치 및 가동			-
	분석결과 : 측정결과 참조      분석결과 : 측정결과 참조		작업일 (2021.07.28)
구분	사진		사진설명
	1동 2층 영어교실	1동 2층 영어교실	
에어샘플러 설치 및 가동			-
	분석결과 : 측정결과 참조      분석결과 : 측정결과 참조		작업일 (2021.07.28)

구분	사진		사진설명
	1동 2층 영어교실	-	
에어샘플러 설치 및 가동		-	-
	분석결과 : 측정결과 참조	-	작업일 (2021.07.28)
