

석면농도측정 결과보고서

석면해체·제거작업 신고번호		전 주 - 20180282	
신고현장	현장명 (공사명·작업명)	전라고등학교 석면해체공사	전화번호 063-543-7973
	소재지	전북 전주시 덕진구 솔내7길 25 전라고등학교	
신고인	석면해체·제거업자명(상호) (주)정부건설	고용노동부 12	등록번호

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의13에 따라 석면농도측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

2018 년 월 일

신고인(석면해체·제거업자) (주)정부건설 박 몽 선 (서명 또는 인)

광주지방고용노동청 전주지청장 귀하

첨부서류	별지 제17호의10서식의 석면농도측정 결과표
------	--------------------------

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체·제거업자)	현장명(공사명·작업명) 전라고등학교 석면해체공사		
	현장 소재지 전북 전주시 덕진구 술내7길 25 전라고등학교		
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20180282	업자명(상호) (주)경부건설
	전화번호	063-543-7973	대표자 박 몽 선

2. 측정기간 2018년 07월 22일 ~ 07월 25일 (4일간)

3. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 형 진	대기환경기사	79308103005Y	
한 주 희	관련학과		

4. 측정결과

측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도($\text{개}/\text{cm}^3$)	초과여부
------	---------	-------------------------	--------------------------------	------

“ 후 면 참 조 ”


5. 측정 위치도 (측정 장소)

“ 후 면 참 조 ”

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의13에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018 년 07 월 26 일

(유) 기 현 환 경 컨 설



석면해체·제거업자 (주)경부건설 귀하

4-1. 측정결과

07월 22일 측정


측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ /min)	측정농도(개/ cm^3)	초과여부
#1 (전라고등학교 1동 본관 1층 회의실)	90	12.45	0.004	기준치미만
#2 (전라고등학교 1동 본관 1층 회의실)	90	12.4	0.004	기준치미만
#3 (전라고등학교 1동 본관 1층 회의실)	90	12.3	0.004	기준치미만
#4 (전라고등학교 1동 본관 3층 통로)	90	12.5	0.002	기준치미만
#5 (전라고등학교 1동 본관 3층 3-1)	90	12.4	0.004	기준치미만
#6 (전라고등학교 1동 본관 3층 3-1)	90	12.3	0.004	기준치미만
#7 (전라고등학교 1동 본관 3층 3-1)	90	12.4	0.004	기준치미만
#8 (전라고등학교 1동 본관 3층 3-6)	90	12.4	0.003	기준치미만
#9 (전라고등학교 1동 본관 3층 3-6)	90	12.35	0.003	기준치미만
#10 (전라고등학교 1동 본관 3층 3-6)	90	12.5	0.003	기준치미만

5-1. 측정 위치도 (측정 장소)

07월 22일 측정


측정위치 전라고등학교 1동 본관 1층

[전라고등학교 1동 본관 1층]

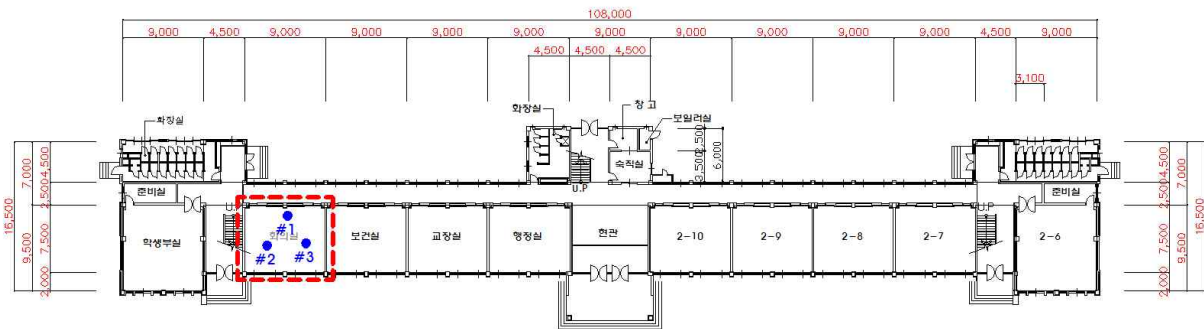

측정위치 전라고등학교 1동 본관 3층

[전라고등학교 1동 본관 3층]

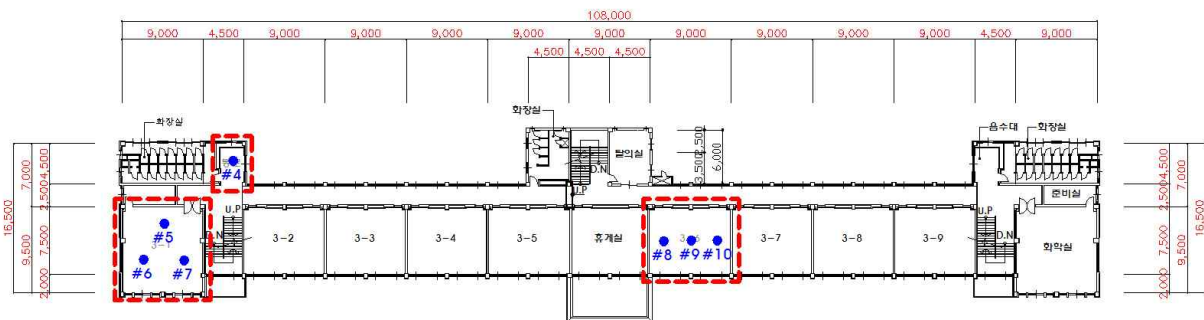

※ 측정사진

07월 22일 측정



#1



#2



#3



#4



#5



#6



#7



#8



#9



#10


4-2. 측정결과

07월 23일 측정


측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
#11 (전라고등학교 1동 본관 2층 도서실)	90	12.4	0.004	기준치미만
#12 (전라고등학교 1동 본관 2층 도서실)	90	12.4	0.004	기준치미만
#13 (전라고등학교 1동 본관 2층 도서실)	90	12.5	0.004	기준치미만
#14 (전라고등학교 1동 본관 2층 탕비실)	90	12.5	0.003	기준치미만
#15 (전라고등학교 1동 본관 2층 음수대)	90	12.45	0.002	기준치미만
#16 (전라고등학교 1동 본관 3층 음수대)	90	12.3	0.003	기준치미만
#17 (전라고등학교 1동 본관 4층 준비실)	90	12.5	0.003	기준치미만
#18 (전라고등학교 1동 본관 4층 준비실)	90	12.4	0.003	기준치미만
#19 (전라고등학교 1동 본관 5층 영어전용실)	90	12.5	0.004	기준치미만
#20 (전라고등학교 1동 본관 5층 영어전용실)	90	12.5	0.004	기준치미만
#21 (전라고등학교 1동 본관 5층 영어전용실)	90	12.4	0.004	기준치미만
#22 (전라고등학교 1동 본관 5층 영어전용실)	90	12.3	0.004	기준치미만

07월 23일 측정


[전라고등학교 1동 본관 2층]

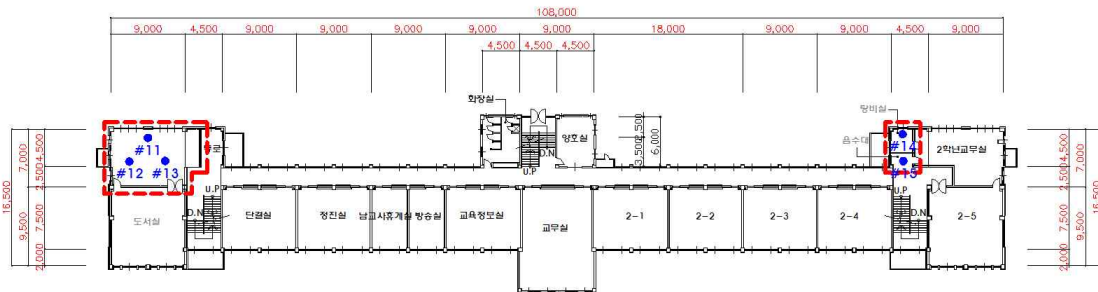


[전라고등학교 1동 본관 3층]

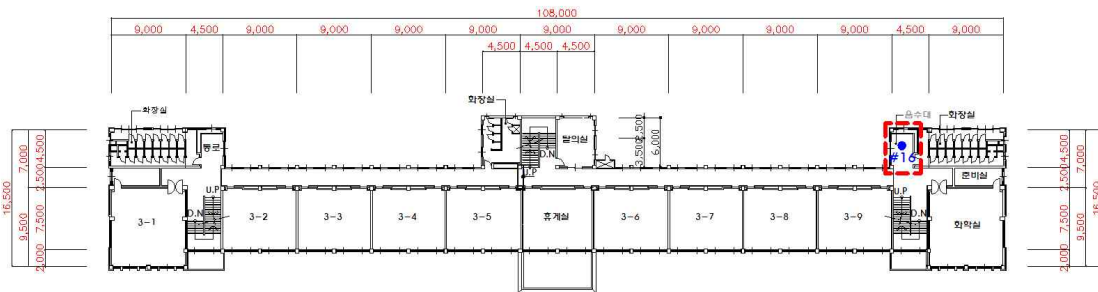

[전라고등학교 1동 본관 4층]

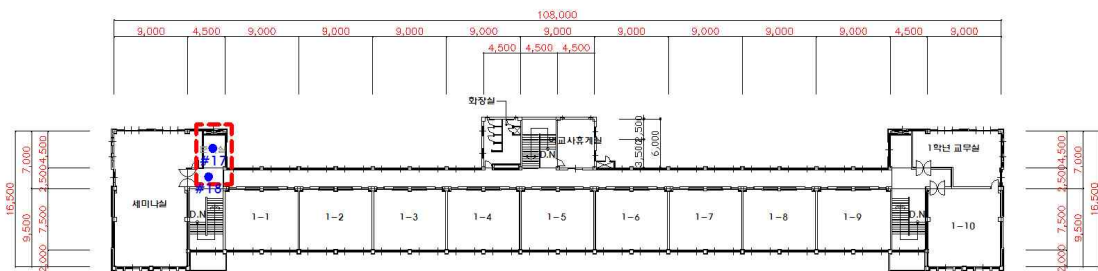

[전라고등학교 1동 본관 5층]

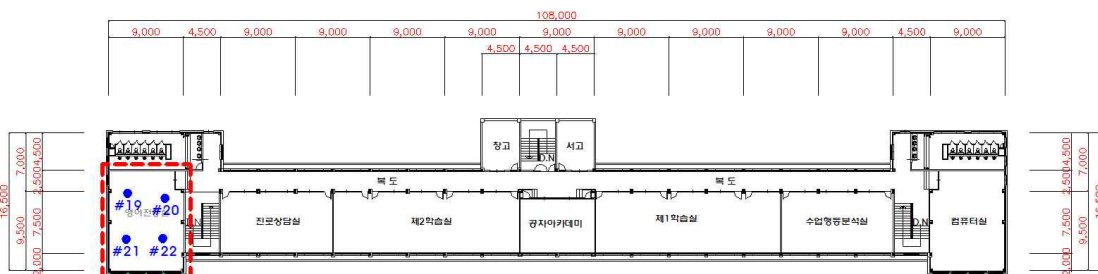

※ 측정사진

07월 23일 측정



#11



#12




#13



#14



#15



#16



#17



#18



#19



#20



#21



#22

4-3. 측정결과


07월 24일 측정


측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/㎤)	초과여부
#23 (전라고등학교 1동 본관 5층 계단실)	90	12.3	0.004	기준치미만
#24 (전라고등학교 1동 본관 5층 계단실)	90	12.3	0.004	기준치미만
#25 (전라고등학교 1동 본관 5층 복도)	90	12.4	0.004	기준치미만
#26 (전라고등학교 1동 본관 5층 복도)	90	12.5	0.004	기준치미만
#27 (전라고등학교 1동 본관 5층 복도)	90	12.25	0.004	기준치미만
#28 (전라고등학교 1동 본관 5층 복도)	90	12.5	0.004	기준치미만
#29 (전라고등학교 1동 본관 5층 복도)	90	12.35	0.004	기준치미만
#30 (전라고등학교 1동 본관 5층 계단실)	90	12.4	0.004	기준치미만
#31 (전라고등학교 1동 본관 5층 계단실)	90	12.5	0.004	기준치미만
#32 (전라고등학교 1동 본관 5층 진로상담실)	90	12.4	0.005	기준치미만
#33 (전라고등학교 1동 본관 5층 진로상담실)	90	12.5	0.005	기준치미만
#34 (전라고등학교 1동 본관 5층 진로상담실)	90	12.5	0.005	기준치미만

5-3. 측정 위치도 (측정 장소)

07월 24일 측정

측정위치 전라고등학교 1동 본관 5층

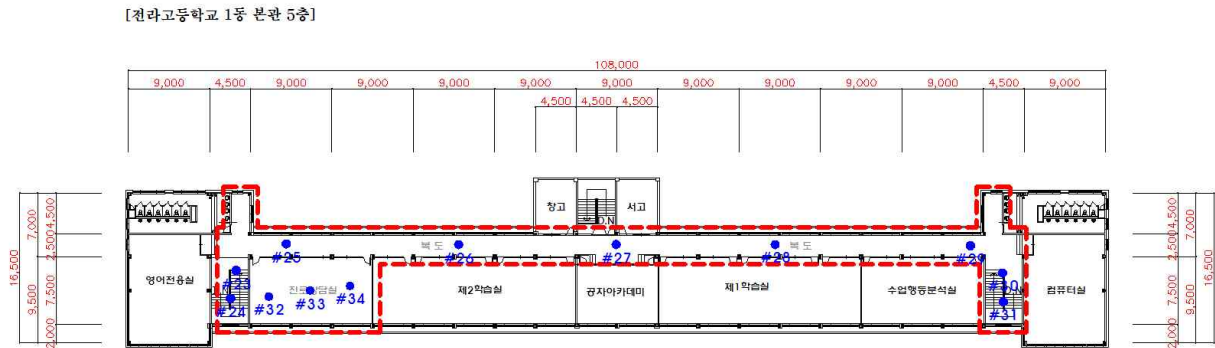





#23




#24



#25



#26



#27



#28



#29



#30



#31



#32



#33



#34



4-4. 측정결과

07월 25일 측정

측정위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/㎤)	초과여부
#35 (전라고등학교 1동 본관 5층 공자아카데미)	90	12.3	0.005	기준치미만
#36 (전라고등학교 1동 본관 5층 공자아카데미)	90	12.2	0.005	기준치미만
#37 (전라고등학교 1동 본관 5층 공자아카데미)	90	12.5	0.005	기준치미만
#38 (전라고등학교 1동 본관 5층 수업행동분석실)	90	12.4	0.004	기준치미만
#39 (전라고등학교 1동 본관 5층 수업행동분석실)	90	12.45	0.004	기준치미만
#40 (전라고등학교 1동 본관 5층 수업행동분석실)	90	12.4	0.004	기준치미만
#41 (전라고등학교 1동 본관 5층 컴퓨터실)	90	12.3	0.004	기준치미만
#42 (전라고등학교 1동 본관 5층 컴퓨터실)	90	12.5	0.004	기준치미만
#43 (전라고등학교 1동 본관 5층 컴퓨터실)	90	12.5	0.004	기준치미만
#44 (전라고등학교 1동 본관 5층 컴퓨터실)	90	12.5	0.004	기준치미만
#45 (전라고등학교 1동 본관 2층 남교사휴게실)	90	12.4	0.003	기준치미만
#46 (전라고등학교 1동 본관 2층 방송실)	90	12.5	0.003	기준치미만

5-4. 측정 위치도 (측정 장소)

07월 25일 측정

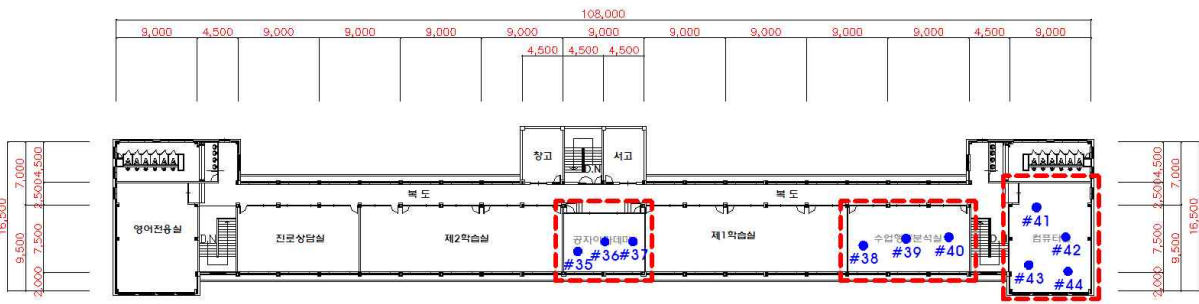측정위치	전라고등학교 1동 본관 5층
<p>[전라고등학교 1동 본관 5층]</p> 	
측정위치	전라고등학교 1동 본관 2층
<p>[전라고등학교 1동 본관 2층]</p> 	



#35



#36



#37




#38



#39



#40



#41



#42



#43



#44



#45



#46
